MATE | by Meta Design
More Than Interior

FIELD RECORD
FREE / 30 PAGES

광명 69㎡, 반셀프 인테리어 공사 기록

철거부터 준공까지,
현장에서 먼저 정하고 확인할 것들.



30페이지 무료 요약본 / 공정별 확인표 · 준공사진

READ FIRST

이 책을 읽는 방법

광명 하안현대아파트 69㎡. 메이트가 감리하고 집주인이 반셀프로 진행한 공사의 156페이지 기록을 30페이지로 줄였습니다. 반셀프공사를 하는 입장에서, 공정이 바뀌기 전에 정할 것과 덮기 전에 확인할 것을 골랐습니다.

현장의 기록

욕실 계획 변경, 거실 천장 보수, 인덕션 전기 작업, 세탁기 반입 문제처럼 기존 최종본에 기록된 일을 바탕으로 합니다.

내 집에 쓰는 도구

확인표와 요청 문장은 독자를 위해 다시 정리한 예시입니다. 광명 현장에서 실제 사용한 서류나 검수 합격 기록을 뜻하지 않습니다.

공개하지 않는 내용

광명 현장의 공사비·절감액·절감률은 수록하지 않습니다. 준공사진만으로 방수·전기·단열 성능이나 하자 여부를 판단하지 않습니다.

처음 읽을 때는 순서대로, 공사 중에는 필요한 공정부터 펼쳐보세요.

CONTENTS

필요한 공정부터 펼쳐보세요

START / 준비 04 - 08

현장 개요 · 선택 기준 · 범위 · 역할 · 공정표

BUILD / 공정별 확인 09 - 14

철거 · 전기 · 천장·단열 · 욕실·방수·타일

FINISH / 마감과 설치 15 - 20

도배 · 마루 · 문·필름 · 싱크대 · 가전 · 기능

RECORD / 현장 도구 21 - 25

변경 · 인계 · 착공 확인표 · 메모 양식 · 마무리

AFTER / 완성된 집 26 - 30

주방 · 거실 · 욕실과 현관 · 다음 공사 · 문의

01 / PROJECT

어떤 집을,
어디까지 고쳤나

20평대 아파트의 전체 도배와 마루, 욕실과 주방, 문과 천장을 손본 공사입니다. 공사기간은 약 3주. 하나의 작업이 끝날 때마다 다음 작업이 시작할 조건을 맞춰야 했습니다.

현장

경기도 광명시 하안동 현대아파트 · 69㎡
메이트 감리 / 집주인 반셀프 진행

실내·바탕

전체 도배와 마루, 거실 천장 철거·재시공, 작은방 측벽 일부 단열, 문틀·문짝 교체와 필름, 중문 공사

습식·가구

욕실 철거·설비·방수·타일·도기, 현관·베란다 바닥 타일, 싱크대, 인덕션에 따른 전기 작업과 조명

이 집의 선택을 그대로 따라 하기보다, 내 집의 기존 상태와 공사 범위를 먼저 적습니다.

02 / PRIORITY

먼저 남길 것과 바꿀 것을 고른다

반셀프는 제품 선택과 분리 발주, 일정 조율에 직접 참여하는 방식입니다. 공정마다 선택할 일이 늘어나므로 시작 전에 원하는 결과와 지킬 기준을 정해두면 판단이 빨라집니다.

기본을 지킬 곳

배관·전기·방수·바탕은 마감 뒤에 손보기 어렵습니다. 겉모양을 고르기 전에 현재 상태와 필요한 작업을 담당 시공자에게 확인합니다.

취향을 쓸 곳

주방 구성, 타일과 필름 색, 조명 배치처럼 눈에 보이고 매일 사용하는 곳의 우선순위를 정합니다. 맞춤 치수가 다른 공정에 미치는 영향도 함께 봅니다.

남길 수 있는 곳

계속 쓸 수 있는 부위는 상태와 새 마감의 접점을 확인합니다. 광명 현관문은 유지했고, 바닥 높이를 맞추는 기준으로 삼았습니다.

- [ ] 꼭 바꾸고 싶은 공간 두 곳을 적었다.
- [ ] 유지할 부위와 새 마감이 만나는 선을 확인했다.

03 / SCOPE

견적은 같은 범위로 나란히 놓는다

금액만 비교하면 포함되지 않은 작업을 놓치기 쉽습니다. 직접 구매한 자재가 있다면 시공 견적에 무엇이 빠졌는지까지 적어야 합니다. 광명 현장의 실제 금액은 이 요약본에서도 공개하지 않습니다.

철거·운반

어디까지 걷어내는지, 폐기물 반출·양중·보양이 포함되는지 봅니다. 추가 철거가 생겼을 때 정할 방법도 확인합니다.

제품·시공

제품명·수량·치수와 부자재, 설치·마감까지 같은 조건으로 맞춥니다. 타일값과 타일 시공 범위는 따로 확인합니다.

변경·마무리

추가 작업, 취소한 항목, 세금, 보수 범위와 담당을 적습니다. 직접 쓴 관리 시간은 별도로 기록합니다.

전달 예시: "이 견적에 빠진 철거·운반·부자재·마감 작업이 있다면 항목별로 표시해 주세요."

04 / PEOPLE

누가 결정하고,
누가 확인할까

가구팀과 전기팀이 서로 다른 제품 자료를 받으면 현장에서 다시 결정해야 합니다. 공사 전에 연락 담당과 승인 담당을 정하고, 확정한 자료 한 벌을 관련 시공자에게 같이 보냅니다.

집주인

사용 방식과 디자인, 구매할 제품, 변경 승인 내용을 정리합니다. 도면·모델·치수가 바뀌면 최신 자료가 무엇인지 표시합니다.

각 공정 시공자

현장의 상태와 제품 조건을 보고 시공 가능 여부·공법·필요한 작업을 판단합니다. 전기 등 전문 작업은 해당 분야 시공자에게 맡깁니다.

감리와 현장 조율

공정 사이의 확인 시점, 가려질 부분의 기록, 변경 내용과 다음 팀의 시작 조건을 함께 살핍니다. 실제 업무 범위는 계약에서 맞춥니다.

- [ ] 변경을 승인할 사람과 연락 수단을 정했다.
- [ ] 도면·제품 자료의 최종본을 관련 팀이 공유했다.

05 / SCHEDULE

날짜 옆에
시작 조건을 적는다

광명은 약 3주 동안 철거, 전기·목공, 욕실·타일, 마루·도배, 가구·조명과 청소가 이어졌습니다. 이 순서를 모든 집에 그대로 적용할 수는 없습니다. 자재 납기와 바탕 상태에 맞춰 날짜를 조정합니다.

철거 → 설비

약속한 철거 범위를 마쳤는지, 드러난 배관·벽·천장 상태에 새 작업이 필요한지 확인합니다.

설비·방수 → 타일

기구 위치·높이, 바탕 정리, 방수 범위와 확인 방법이 정리돼야 합니다. 제품별 건조·시공 조건을 따릅니다.

바탕 → 마감·가구

벽·천장의 보수와 전기 위치를 정리합니다. 마루 이후에는 도배·가구팀의 이동 동선과 보양을 인계합니다.

다음 팀과 날짜를 잡을 때 "무엇이 끝나 있어야 들어올 수 있나요?"를 함께 묻습니다.

06 / DEMOLITION

철거 범위는 사진 위에 표시한다

광명 현장에서는 첫날 철거를 마치지 못해 다음 날 욕실 바닥과 현관 바닥 타일의 범위를 다시 지시했습니다. "욕실 철거" 한 줄보다, 남길 것과 없앨 것을 부위별로 표시하는 편이 정확합니다.

착수 전

욕실 벽·바닥, 문틀, 싱크대, 장판 등 철거할 부위를 표시합니다. 유지할 현관문과 설비, 공용부 보양도 구분합니다.

걷어낸 뒤

계획과 다른 배관, 약한 바탕, 여러 겹의 마감이 나오면 사진을 남깁니다. 추가 철거·보수 범위와 다음 작업 영향을 확인합니다.

- ☐ 벽·바닥·문틀의 철거 경계가 표시돼 있다.
- ☐ 폐기물 반출 뒤 남은 작업을 따로 적었다.
- ☐ 설비팀이 작업을 시작할 수 있는지 함께 봤다.

전달 예시: "욕실 바닥까지 포함한 철거 범위를 사진에 표시했습니다. 남길 배관과 추가 작업이 필요한 곳은 시작 전에 알려주세요."

07 / ELECTRIC

인덕션을 고르면 전기팀에도 알린다

광명에서는 인덕션을 추가하며 분전반 교체와 배선 증설 작업이 생겼습니다. 조리기구 선택이 전기 공정과 벽체 작업까지 이어진 사례입니다.

제품 자료부터 공유

확정한 모델명과 설치 안내서를 전기팀·가구팀에 함께 전달합니다. 상판 타공과 전원 공급 조건을 각각 확인합니다.

목공 전에 확인

소비전력, 회로, 분전반 상태와 배선 경로는 전기 시공자가 확인합니다. 콘센트와 조명 위치도 벽과 천장을 닫기 전에 맞춥니다.

가려지기 전 기록

위치가 보이는 전체 사진과 연결 부위의 상세 사진을 남깁니다. 변경된 위치는 도면에도 표시해 다음 팀이 알 수 있게 합니다.

- [ ] 가구팀과 전기팀이 같은 제품 자료를 받았다.
- [ ] 추가 작업의 범위와 일정 영향을 확인했다.

08 / CEILING

천장과 단열은 마감 전에 판단한다

공사일지에는 거실 천장 석고가 무너져 전체 재시공을 결정한 일이 기록돼 있습니다. 작은방은 측벽 일부에 단열 작업을 했습니다. 철거 후 드러난 상태에 따라 보수 범위를 다시 정해야 했습니다.

천장 보수

손상된 곳의 범위를 시공자와 확인하고, 원래 계약에 없던 작업은 별도 변경으로 남깁니다. 전선·조명 위치와 후속 도배 일정도 다시 맞춥니다.

작은방 단열

작업할 면과 창·천장·콘센트가 만나는 자리를 함께 봅니다. 단열재와 벽을 고르게 만드는 석고보드 바탕은 구분합니다.

덮기 전 인계

완료한 범위와 남은 확인 항목을 적고 사진을 보관합니다. 사진만으로 단열 성능이나 결로 해소를 확정하지 않습니다.

전달 예시: "손상 부위와 보수 범위를 사진으로 공유해 주세요. 방법과 추가 작업, 도배 시작일 영향을 확인한 뒤 결정하겠습니다."

09 / BATHROOM PLAN

욕실은 기구 위치부터 그려본다

광명 욕실은 철거 후 실제 크기와 배관을 보고 욕조 계획을 취소했습니다. 타일 색을 정하기 전에 세면대·양변기·수전, 콘센트와 수납장이 함께 들어가는 그림을 확인해야 합니다.

벽 네 면을 펼쳐 보기

전개도에 기구의 중심과 높이, 거울·수납장·콘센트 위치를 표시합니다. 바닥 기준인지 완성 마감 기준인지도 함께 적습니다.

문과 몸이 움직일 자리

문을 열었을 때 기구에 닿는지, 샤워할 공간과 수납장 문 열림이 확보되는지 봅니다. 제품 모델과 실제 배관을 대조합니다.

- ☐ 기구·거울·수납장 모델과 치수를 공유했다.
- ☐ 기준점이 표시된 위치·높이를 확인했다.
- ☐ 철거 뒤 실제 배관에 맞춘 변경을 승인했다.

전달 예시: "기구와 콘센트·수납장까지 표시한 도면을 보고 싶습니다. 배관을 옮겨야 하는 부분은 시공 전에 함께 확인해 주세요."

10 / WATERPROOF

방수는 덮기 전에 범위와 상태를 남긴다

광명 기록에는 욕실 철거 뒤 배관과 모서리 바탕을 다시 살핀 과정이 담겨 있습니다. 타일을 붙이면 가려지므로 설비·방수팀과 확인할 시점을 미리 잡습니다.



욕실 도막방수 작업 중 기록

바탕

모서리에 남은 철거 잔재와 약한 부분을 어떻게 정리할지 확인합니다. 배관 주변과 벽·바닥이 만나는 곳도 함께 봅니다.

시공 조건

사용 제품, 작업 범위, 건조 조건, 다음 공정에 넘기기 전 확인 방법을 시공자와 맞춥니다. 모든 현장에 같은 시간·횟수를 적용하지 않습니다.

기록

전체 위치 사진과 모서리·관통부의 상세 사진을 남깁니다. 확인하지 못한 항목은 미확인으로 적고 타일 착수 전에 전달합니다.

독자 확인 항목입니다. 이 페이지는 광명 욕실의 방수 시험 합격이나 누수 없음에 대한 확인서가 아닙니다.

11 / TILE

타일은 모서리와 완성 높이까지 고른다

큰 타일이나 졸리컷은 자재 선택과 함께 바탕·절단·모서리 마감의 조건을 봐야 합니다. 광명에서는 욕실 전체 철거와 현관·베란다 바닥 작업의 출발 조건이 서로 달랐습니다.

욕실

기구 위치와 벽 높이, 타일 배치와 끝줄, 모서리 마감 범위를 시공자와 확인합니다. 자재를 바꾸면 작업과 일정이 달라지는지도 묻습니다.

현관

상부 타일을 걷은 뒤 아래에 기존 타일이 더 나왔습니다. 유지할 현관문틀과의 높이를 보고 아래 타일을 남겨 덧방하는 방식으로 바꿨습니다.

베란다

기존 타일의 상태, 창호·문과의 간섭, 배수구 주변을 확인합니다. 덧방을 선택해도 바탕 확인과 높이 조정은 필요합니다.

- [ ] 줄눈·모서리와 타일 끝선이 정해져 있다.
- [ ] 새 바닥 높이에서도 문과 창이 작동한다.

12 / WALL

도배지보다 먼저 벽 바탕을 본다

광명 기록에는 오래된 벽이 고르지 않아 도배 마감이 아쉬웠다는 회고가 남았습니다. 벽지를 고르는 날보다 철거 직후와 목공 단계에 벽 상태를 보는 일이 필요했습니다.



기존 벽 마감 제거 후 바탕 기록

면별로 판단

굴곡, 균열, 들뜸과 습기 흔적이 있는 곳을 표시합니다. 기존 면 보수로 할지, 별도 바탕 작업이 필요한지 목공·도배팀과 협의합니다.

함께 달라지는 것

벽체 바탕을 새로 잡으면 실내 치수와 문틀·창호·콘센트 주변 마감도 달라집니다. 필요한 면과 비용을 따로 정합니다.

도배팀에 넘길 상태

천장·문틀 주변 보수와 필름 끝선을 확인합니다. 아직 고치지 않은 곳을 도배로 가리지 않도록 작업 전에 공유합니다.

전달 예시: "이 벽의 굴곡이 도배 뒤에도 보일 수 있는지 봐주세요. 바탕을 손볼 범위와 방법을 먼저 정하고 싶습니다."

13 / FLOOR

마루는 경계와 다음 작업까지 본다

광명은 기존 장판을 걷고 실내 마루를 시공했습니다. 그 뒤 도배·가구·조명 작업이 이어졌습니다. 마루가 끝나도 새 바닥 위를 여러 팀이 이동합니다.

시공 전

바닥의 굴곡·습기·남은 접착물과 필요한 보수를 확인합니다. 문틀 아래, 현관 타일과 만나는 경계의 마감도 미리 정합니다.

시공 후

문 앞과 벽 가장자리, 재료가 바뀌는 경계를 살핍니다. 문 여닫힘과 이음매, 들뜸·꺼짐처럼 걸으며 느껴지는 부분을 위치별로 기록합니다.

다음 팀 인계

가구 반입 길과 공구를 놓을 자리, 보양 범위를 정합니다. 보양 방법과 유지 조건은 자재 안내 및 시공자 설명에 맞춥니다.

- [ ] 문틀·타일 경계의 마감이 정리됐다.
- [ ] 후속 팀이 바닥 상태와 보호 범위를 공유했다.

14 / DOOR & FILM

문과 필름은 만나는 선을 맞춘다

광명 공사에는 문틀·문짝 교체, 필름과 중문 작업이 포함됐습니다. 문 하나를 따로 보면 놓치는 것이 있습니다. 바닥 높이, 벽 두께와 마감 끝선을 함께 봐야 합니다.

문틀·문짝

완성 바닥 높이에서 문이 걸리지 않는지, 손잡이와 주변 벽·가구가 간섭하지 않는지 확인합니다. 현장 실측값을 목공팀과 공유합니다.

필름

감쌀 면과 남길 면, 모서리와 문틀 끝선, 도배와 만나는 자리를 구분합니다. 바탕 보수와 손상 부위가 있다면 마감 전에 확인합니다.

중문·출입 동선

열리는 방향과 실사용 통로를 봅니다. 가전과 가구가 지나갈 폭도 확인하고, 이후 반입팀에 확정 치수를 전달합니다.

독자 확인 항목입니다. 사진만으로 문틀 고정 상태나 제품 설치 기준 충족 여부를 판단하지 않습니다.

15 / KITCHEN

싱크대 실측 전에 가전 모델을 보낸다

광명은 착공 후 싱크대를 실측했고, 제작과 설치 일정을 빠듯하게 맞췄습니다. 주방을 재는 날에 냉장고·조리기구·싱크볼의 자료가 함께 있어야 가구와 전기·설비를 맞출 수 있습니다.

가구팀

제품 모델과 설치 안내서, 싱크볼·인덕션 위치, 문과 서랍이 열리는 범위를 공유합니다. 제작 승인 전에 최종 도면을 대조합니다.

전기·설비팀

전력과 콘센트, 급배수 위치가 가구 안에서 맞는지 확인합니다. 설치 뒤 점검과 수리에 접근할 수 있는 자리도 봅니다.

제작·설치 일정

실측, 도면 승인, 발주, 설치일을 각각 적습니다. 모델이나 위치 변경이 제작과 다음 공정에 미치는 영향을 확인합니다.

- [ ] 모든 팀이 같은 모델·도면을 사용한다.
- [ ] 타공·전원·급배수 조건을 제작 전에 맞췄다.

16 / APPLIANCE

세탁기는 들어갈 길부터 잰다

광명에서는 새 세탁기가 기존 보일러실 문을 통과하지 못해 문 쪽 벽체와 석고를 다시 작업했습니다. 제품을 놓을 공간과 현관에서 그곳까지 옮길 길을 함께 확인해야 했습니다.

01 제품

모델명, 본체의 너비·깊이·높이를 적습니다. 포장·운반 상태의 크기와 문을 열었을 때의 범위도 판매처에 확인합니다.

02 반입 길

현관·복도·중간 문, 방향을 꺾는 자리와 바닥 턱을 봅니다. 문짝을 열었을 때의 실제 통과 폭과 돌출물을 함께 잽니다.

03 설치 자리

급배수·전원 위치와 제조사가 요구하는 설치 여유를 확인합니다. 배송·설치 기사에게 경로와 현장 사진을 미리 전달합니다.

제품명 / 제품 치수 / 최소 통과 폭 / 설치 여유 / 확인 담당.
이 다섯 항목을 한 장에 모아 목공·가구·설비팀과 공유합니다.

17 / FUNCTION

불을 켜고
물을 틀어본다

마감이 끝나면 사용해 보며 남은 일을 적습니다. 아래는 독자용 확인 기준이며, 광명 현장의 검사 결과를 대신하지 않습니다. 전문 판단이 필요한 이상은 담당 시공자에게 확인을 요청합니다.

조명·전기

각 스위치와 조명이 의도한 위치에서 작동하는지 봅니다. 콘센트와 기구 연결은 담당자의 확인 방법에 따라 점검합니다.

물·배수

수전을 작동시켜 연결부와 하부장을 보고, 배수 상태와 주변 흔적을 확인합니다. 이상 위치를 사진과 함께 적어 설비팀에 전달합니다.

문·가구·마감

문·서랍을 열고 닫아 간섭을 봅니다. 필름 들뜸, 도배·마루 끝선, 타일 경계는 위치를 표시해 보완 목록에 넣습니다.

- [ ] 잘 보이지 않는 하부와 경계도 확인했다.
- [ ] 미확인 기능을 완료 항목과 구분해 적었다.

18 / CHANGE

바뀐 일은 승인 기록으로 남긴다

광명의 천장 재시공, 인덕션 전기 작업, 세탁기 반입 재작업은 이유가 서로 다릅니다. 새로 드러난 상태와 취향·제품의 변경을 구분하면 일정과 추가 작업을 이해하기 쉽습니다.

처음 약속

견적·도면에 포함됐던 범위를 적습니다. 새로 발견한 상태는 위치가 보이는 사진으로 남깁니다.

바꿀 작업

추가·취소할 내용, 작업 방법과 마감 범위를 시공자에게 확인합니다. 관련 팀의 일정 변화도 같이 받습니다.

승인과 공유

결정한 사람, 날짜, 합의한 금액과 일정을 변경 기록에 남깁니다. 확정된 내용은 다음 팀에게 같은 자료로 보냅니다.

전달 예시: "처음 범위와 달라진 부분, 추가·취소 작업, 비용과 일정 영향을 나눠 적어주세요. 확인 후 결정하겠습니다."

19 / HANDOVER

다음 팀이 시작할 수 있어야 한다

한 팀이 맡은 작업을 마쳐도 다음 팀은 다른 정보를 필요로 합니다. 앞 공정이 가려지는 순간에는 잠깐 멈춰 사진·치수·남은 일을 전달합니다.

철거 → 설비

욕실 바닥까지 철거 범위를 확인하고, 드러난 배관 위치와 잔재 상태를 남깁니다.

설비·방수 → 타일

기구 배관·콘센트·수납장 위치, 바탕과 모서리, 방수 범위와 확인 사항을 공유합니다.

목공·전기 → 도배

천장과 작은방 측벽, 문틀 바탕, 조명·콘센트 위치와 필름 끝선을 맞춥니다.

바닥 → 가구·마감

타일과 마루의 경계, 새 바닥 보호 범위, 가전 반입 동선을 전달합니다.

"오늘 끝난 일 / 남은 일 / 사진과 치수 / 다음 팀의 확인" 네 칸으로 짧게 보냅니다.

20 / BEFORE WORK

착공 전에 한 장으로 모을 것

여러 채팅방에 흩어진 결정을 한 장으로 모읍니다. 도면과 제품 자료의 날짜를 표시하고, 바뀐 항목은 관련 팀이 받았는지 확인합니다.

- ☐ 범위: 없앨 것·남길 것·새로 할 것을 표시했다.
- ☐ 욕실: 기구·콘센트·수납장 위치와 높이를 그렸다.
- ☐ 가전: 모델, 반입 길과 설치 여유를 확인했다.
- ☐ 바탕: 천장·벽·단열을 확인할 시점을 잡았다.
- ☐ 발주: 실측·승인·자재 도착·설치일을 구분했다.
- ☐ 변경: 승인 담당과 비용·일정 확인 방법을 정했다.
- ☐ 인계: 가려지기 전 사진과 다음 팀 전달 담당을 정했다.

모르는 항목은 빈칸으로 숨기지 말고 "미정 / 확인 담당 / 결정할 날"로 남깁니다.

21 / FIELD SHEET

현장 인계 메모

독자용 빈 양식입니다. 광명 현장에서 실제 사용한 문서가 아닙니다. 출력하거나 필요한 칸을 복사해 사용하세요.

현장 / 날짜 / 작업 위치

오늘 끝난 일과 확인한 상태

남은 일 / 미확인 항목

사진 파일명 / 치수와 기준점

변경 내용 / 승인 / 비용·일정 확인

다음 팀 / 시작 전 조건 / 확인할 날

이 메모의 작성이나 서명은 검수 합격 또는 하자 면책을 뜻하지 않습니다. 계약과 검수 기준은 별도로 확인합니다.

22 / FINISH

마무리할 때 확인과 보완을 나눈다

준공청소 뒤에도 보완과 미확인 항목이 남을 수 있습니다. 사진이 깨끗하게 나오는지와 실제로 사용 가능한지는 각각 확인합니다. 잔금·검수 조건은 계약과 함께 봅니다.

- ☐ 기능: 조명·수전·배수·문·서랍을 확인했다.
- ☐ 경계: 타일·마루·도배·필름 끝선을 살폈다.
- ☐ 보완: 위치·내용·담당·예정일을 적었다.
- ☐ 기록: 보완 전·후 사진을 같은 위치에서 남겼다.
- ☐ 인수: 제품 안내서와 필요한 관리 정보를 받았다.
- ☐ 정리: 변경 승인과 지급·미지급 내역을 구분했다.

보완 기록 예시: "주방 싱크대 하부 / 확인할 내용 / 담당 / 방문 예정일 / 재확인일". 완료되지 않은 항목은 그대로 남깁니다.

23 / AFTER - KITCHEN

주방,
매일 쓰는 자리

상부장과 하부장, 싱크볼과 가전이 놓인 준공 모습입니다. 제품과 설치 조건을 공유한 과정이 최종 공간으로 이어집니다.



광명 현장 준공사진 · 가구와 가전이 배치된 주방

24 / AFTER - LIVING

거실과 방,
벽과 바닥이 만나는 면

밝은 벽과 나무색 바닥에 빛이 들어옵니다. 완성된 면을 보면서, 목공과 도배 전에 정할 바탕과 끝선을 함께 떠올려봅니다.



광명 현장 준공사진 · 거실의 벽·천장·바닥


25 / AFTER - DETAILS

욕실과 현관,
몸이 움직이는 자리

욕실 기구와 문, 현관의 수납과 통로를 봅니다. 사용하는 높이와 문 열림, 바닥 경계를 미리 확인할 이유가 이 작은 공간에 모여 있습니다.



욕실 / 기구와 거울·수전

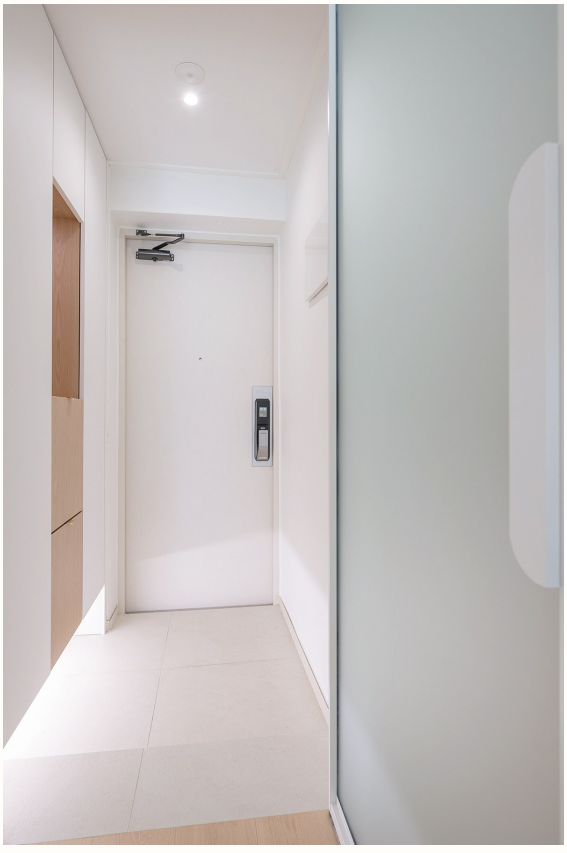

현관 / 문·수납·통로

준공사진은 완성 모습의 기록입니다. 배수·방수·고정 상태는 현장에서 별도 확인합니다.

협력타일업체 - 세원세라믹 (https://sewon-ceramic.com)

26 / TAKEAWAY

다음 공사에서는 결정할 시점부터 바꾼다

광명 기록에서 되짚을 일은 제품을 고르는 순서와 현장을 확인할 시점입니다. 철거 뒤에야 보이는 상태도 있지만, 모델·치수·작업 범위는 더 일찍 정리할 수 있습니다.

착공 전에

욕실 배치와 가전 모델, 싱크대 실측·발주, 철거 경계를 정합니다. 관련 팀이 같은 도면과 제품 자료를 보게 합니다.

가리기 전에

드러난 천장·벽·배관을 확인하고 변경을 승인합니다. 방수·전기·단열·바탕 사진에 위치를 붙여 보관합니다.

넘기기 전에

끝난 일과 남은 일을 나누고 다음 팀이 시작할 조건을 묻습니다. 늦어진 결정이 어디에 영향을 주는지 함께 확인합니다.

더 자세한 공정 기록과 사진은 MATE 홈페이지의 광명 전자책 전체본에서 이어서 볼 수 있습니다.
mateinterior.com/books

MATE | by Meta Design
More Than Interior

CONTACT MATE

우리 집 공사도
메이트와 이야기해 보세요

반셀프 인테리어 감리와 공사 상담은
메이트 홈페이지에서 신청할 수 있습니다.

공사 지역과 면적, 희망 일정, 바꾸고 싶은 범위를
알려주시면 상담에 도움이 됩니다.

mateinterior.com

감리 · 공사 상담 신청 →

MATE by Meta Design · 2026.11 무료 요약본
156페이지 전체본을 재편집했습니다. 공사비 비공개.
확인표와 요청 문장은 독자용 예시이며 실제 검수 결과가 아닙니다.
